

도심하천 생태복원사업

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		● (지자체)			●	●			●

- 도심 복개하천(도로) 생태복원으로 수질개선, 수생태계 회복, 도시환경개선, 친환경 공간 확보하여 삶의 질 향상
- 원도심 노후화, 인구감소로 침체된 복개하천 주변을 생태하천 복원하여 도시의 재생 및 활성화 유도
- 시민정서 함양, 휴식공간, 볼거리 등 제공 및 관광객 유치효과기대

사업개요

- 사업명 : 학산천 생태하천 복원사업
- 위치 : 포항시 북구 중앙동 일원
- 사업구간 : 우현동 도시숲 ~ 중앙동행정복지센터 ~ 동빈내항
- 사업기간 : 2018. 03. ~ 2023. 06.
- 총사업비 : 394억원(국 182, 도 64, 시 148)
- 사업량 : 하천복원 0.9km 하천폭 10.0m(전체폭 23.0m)
- 강우강도 : 50년 빈도적용(하천복원)

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'19	'20	'21	'22	'23
총사업비	394	-	7	50	68	238	31
국비	182	-	-	25	34	123	-
도비	64	-	-	8	10	37	9
시비	148	-	7	17	24	78	22

▶ 경상북도 도움(제도, 재정, 권한) : 도의 재정적 지원 필요

연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (입기내)	'19	'20	'21	'22	'23
생태하천 복원사업	공정	착공	기본계획 수립	착공	-	-	준공


추진상황

- 2016.10. ~ 2018.12. : 도심하천 생태복원 타당성 및 기본계획수립 용역
- 2018. 8. : 환경부, 경북도, 한국환경공단 업무협의
- 2018.10. ~ 11. : 주민설명회 및 의견청취(개발자문위, 통장, 자생단체 등)
- 2019. 6.19. : 수생태계 복원계획 수립(대구지방환경청)
- 2019. 6.25. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019.9.26. ~ 2020. 2. 5. : 주민설명회(4회), 사업구간 주변 주민들 개별 상담(60회)
- 2020. 8.20. : 지방건설기술심의위원회 심의(경북도, 조건부 승인)
- 2020.10.29. : 포항시 도시계획위원회 도시관리계획 결정(변경) 심의(조건부 수용)
- 2020.12.24. : 도시관리계획(학산문화공원) 결정 고시
- 2020.12.29. : 생태하천 복원구간 지중화사업 승인(산자부)
- 2020.11.19 : 도시계획시설 결정(변경) 고시
- 2020.12.04 : 도시공원위원회 심의
- 2020.12.15 : 설계서 검토 완료(대구지방환경청)
- 2020.12.16 : 생태하천 복원사업(1차분) 착공
- 2021.12.10. : 1차분 준공(교량 기초 및 교대 설치((구)수협 앞), 우수관로 설치 L=193m)
- 2021.12.11. : 2차분 착공(교량 설치 2개소(중앙동행정복지센터 앞, (구)수협 앞), 우수관로 설치 L=282m)

향후계획

- 2022. 3. : 교량 임시 개통((구)수협 앞)
- 2022.10. : 교량 임시 개통(중앙동행정복지센터 앞)
- 2022.12. : 2차분 준공
- 2023. 6. : 시험운영 및 준공
- 2023. 7. : 생태하천 운영 모니터링 및 잔여 도심하천 단계별 복원 추진

위치도

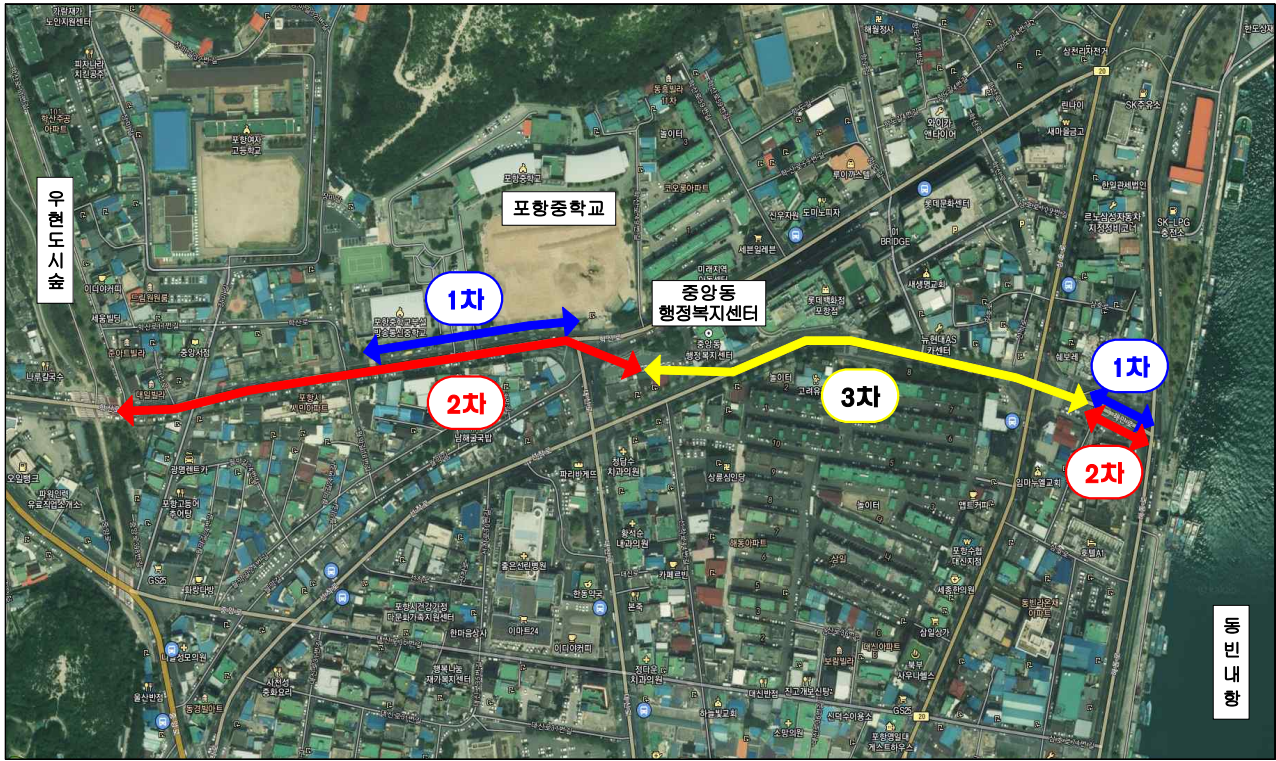

조감도



추진 부서	생태 하천과	부서장	이삼우 (4870)	팀장	정석진 (4892)	담당자	오성훈 (4893)	협업 부서	녹지과 공원과 교통지원과
----------	-----------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	---------------------
