

# 도심권 단절 숲길 연결사업

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (산림청)			●	●			●

- 도로개설 및 개발로 단절된 숲길을 생태적 기법 연결로 시민들에게 편의 제공
- Green Way 사업과 연계하여 포항시의 역사와 문화를 엮어주는 숲길 조성

## ■ 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 이동 340-1(포항IC진입로) 외 3개소
- 사업기간 : 2020 ~ 2022
- 사업내용 : 도심권 단절 숲길 연결 4개소
- 총사업비 : 59억원(도38, 시21)

## ■ 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	59	-	-	-	10	20	29
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	38.35	-	-	-	6.5	13	18.85
시 비	20.65	-	-	-	3.5	7	10.15

## ■ 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
포항IC진입로	개소	1				1	
연화재	개소	1					1
소티재	개소	1					1
교육청	개소	1					1


## 추진상황

- 2017.12.06. : 타당성 조사 및 기본구상용역
- 2019.04.26. : 지방재정 투자심사 반영
- 2019.11.13. : 중기재정계획 반영
- 2020.02.18. : 실시설계용역 착공(포항IC진입로)
- 2020.06.04. : 포항시 기술자문 심의(교량특허공법 선정)
- 2021.04.26. : 한국도로공사 설계심의
- 2021.05.17. : 경상북도 계약원가 심사
- 2021.06.21. : 포항IC진입로 단절 숲길 연결 공사 시행
- 2021.12.30. : 포항IC진입로 단절 숲길 연결 공사 준공

## 향후계획

- 2022.01. ~ 12. : 도심권 단절 숲길연결 사업 시행(연화재 외 2개소)

## 위치도 및 조감도(포항IC진입로)

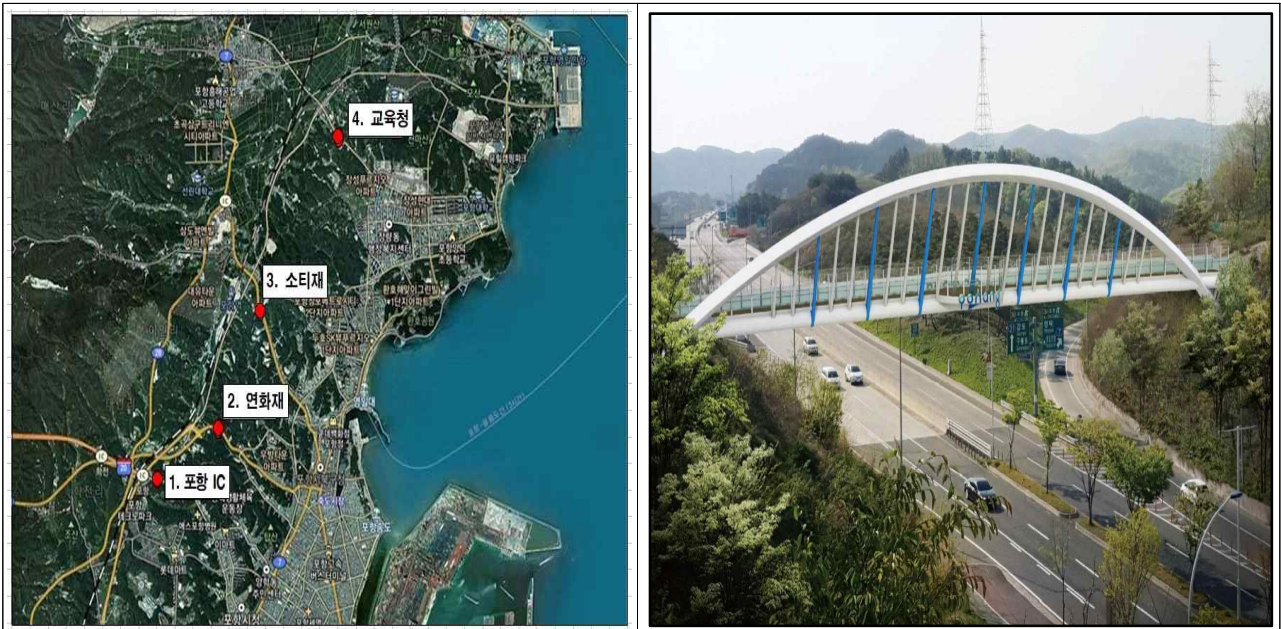

추진 부서	녹지과	부서장	류성욱 (3230)	담당	김을태 (3822)	담당자	김준수 (3823)	협업 부서	
----------	-----	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	--
